

### グラウンド人工芝化工事進捗について③


グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。

「グラウンド人工芝化工事進捗②」でもご報告しました仕上げ作業が完了し、11月13日に人工芝が運び込まれました。いよいよ人工芝の敷設作業が始まります。



長方形に模られたカーペット状の人工芝が、丸められた状態で運び込まれました。

前期工事では、1枚当たり幅4m、長さは最長で57mの人工芝ロールを24枚、面積にして2,854㎡を敷設します。

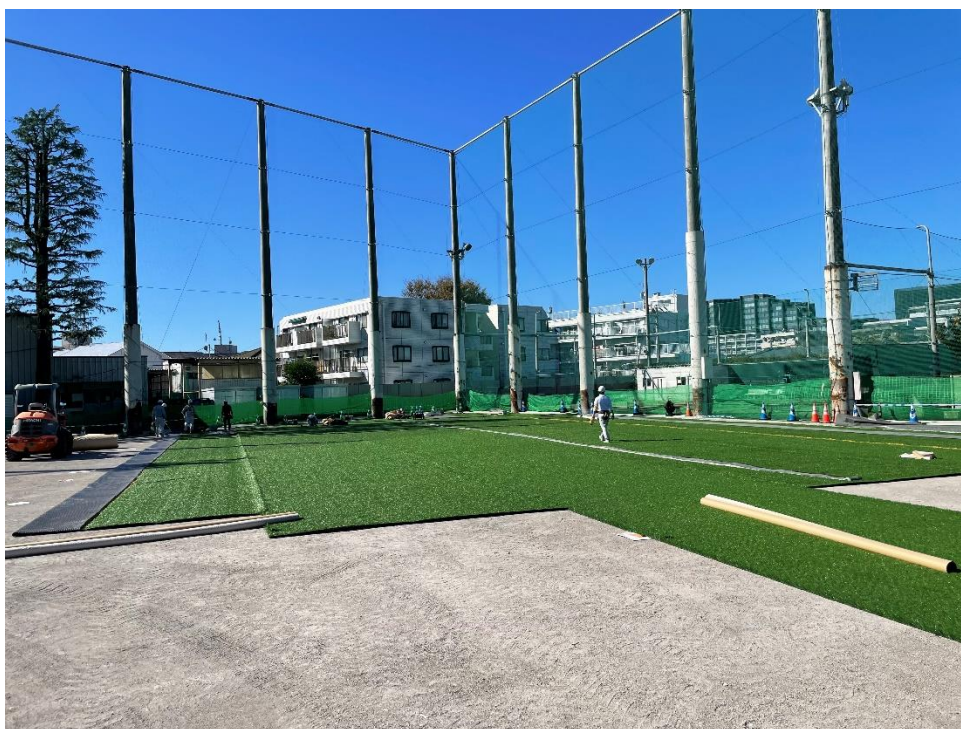

翌日、人工芝ロールを広げていく作業に入りました。

2ヵ月もの期間を掛けて行われた整地作業に対して、敷設作業は非常に短期間の内に進んでいき、その日の夕方

には、前期工事分の 2/3 程の範囲に人工芝が敷き詰められていました。



引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。
