


グラウンド人工芝化工事進捗について⑤

グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。

現在、色付き人工芝の入れ込み作業が終わり、珪砂・ゴムチップを撒く作業を行っております。

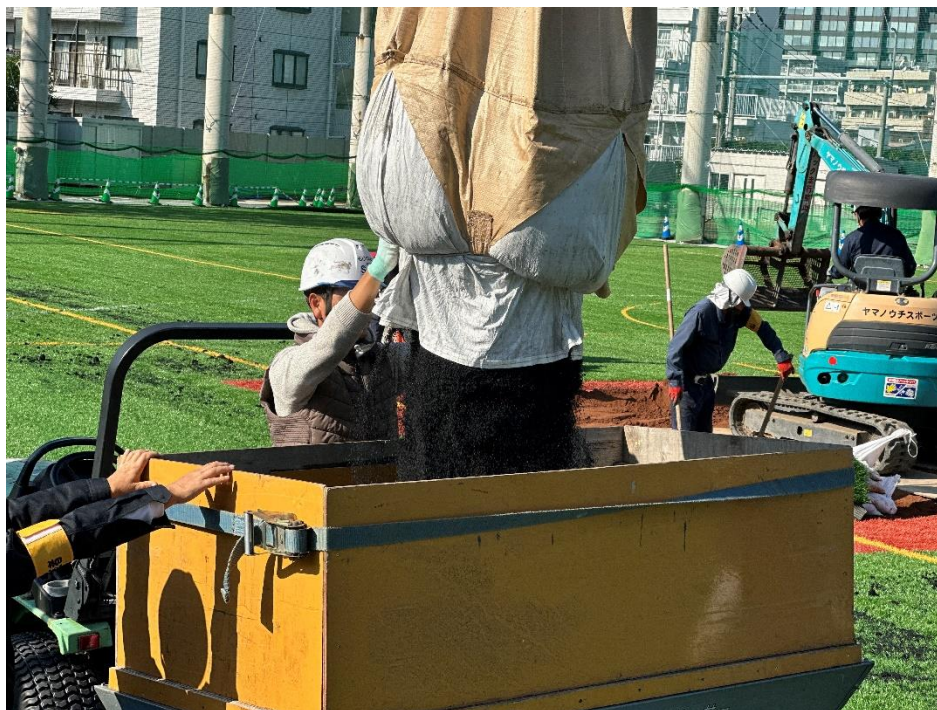

この作業では、珪砂 70 トン・黒色ゴムチップ 23.5 トン・緑色ゴムチップ 18 トンを使用します。全体的に撒いた後に、ブラシをかけてムラの無いよう広げていきます。



珪砂→ゴムチップ→珪砂→ゴムチップといった順に繰り返し撒き、最上段に緑色のゴムチップを撒き終わると、計8層で高さ4cmの層が出来上がります。

それにより人工芝がしっかり立つため、クッション性の高いグラウンドとなります。

また、最上段に撒いた緑色のゴムチップにより、5度～8度の熱抑制効果が発揮されます。



以上の作業とアンツーカー部分の作業が終わりますと、いよいよ前期工事は完了となります。

引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。
