


グラウンド人工芝化工事進捗について⑫

グラウンド人工芝化工事について、進捗状況をご報告させていただきます。



色付き人工芝の埋め込みと、人工芝を立ち上がらせるための砂とゴムチップの散布作業が完了いたしました。

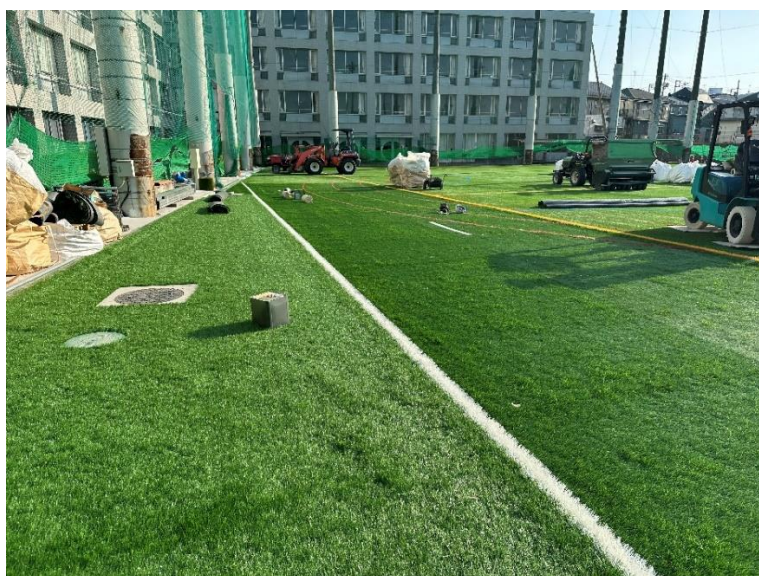

資材置き場のため敷設していなかった部分(写真右上の黄色い線より左側)の敷設作業も行っております。



黄色い線を境に右側が散布作業後、左側が作業前となっております。

散布後の人工芝はしっかりと立ち上がっており、クッション性がとても高く、見栄えも良いです。

後期工事では、砂を 56 トン・黒ゴムチップを 19 トン・緑ゴムチップを 12.5 トン使用します。

もう一息で後期工事が終了いたします。

引き続き、安全に配慮した上で進めて参ります。また進捗がありましたら、ご報告させていただきます。
